



26/11/2023 א'

מתי"א

יחיים משה שפירא אשדוד רובע ד

100101

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-100101

סוג המוסד-מוסדות ציבור

שם המוסד-מתי"א

כתובת המוסד-חיים משה שפירא

תאריך המבדק-א' 12/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק\חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




כיתות -מגן אצבעות לא תקין/ לא קיים במספר רב של מוקדים. יש לדאוג לסטופר מתאים- מיועד לתפוס את הדלת בסוף תנועתה- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. 1-לימוד. חדרי ספח. מפגע גורף
האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם
5.23-18/3/2023 20: 30 דלתות-לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




-מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות-1-ליד כיתה 18-קולר לא מקובע לקיר. סכנת התהפכות ופציעה- - -
5.7-18/3/2023 20: 32 מפגעים קבועים וניידים



הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' -2-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-הגדר ההיקפית נמוכה מהנחיות המשרד. סכנת טיפוס ופציעה- - -
3.26-18/3/2023 20: 35 גדר-לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל

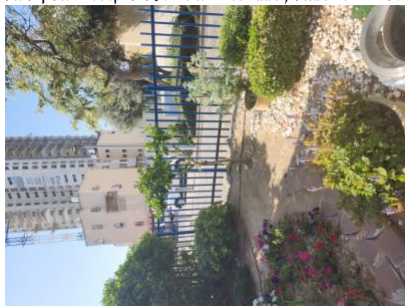

המרחק 1-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-המרווח בין הגדר לבין הקורה מתחתה נמצא מעל 10ס"מ. סכנת הילכדות ופציעה- - -
3.29-18/3/2023 20: 38 גדר-ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה על 10 ס"מ

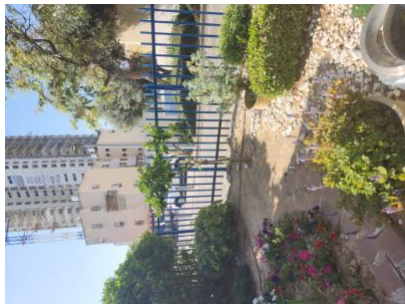

גדר סורגים יש -2-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-.המרווחים של הגדר נמצאו כשהם יותר מ- 10 ס"מ בין המוטות הסמוכים- - -
 20: 42 3.27-18/3/2023 -גדר-. לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם



צמחיה במוסד- לא תימצא -1-חצר אחורית של ביה"ס-.ענפים יבשים ודוקרניים. ענפים שאינם גזומים ונמצאים בגובה אדם- - -
 צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את
 20: 44 3.18-18/3/2023 -ארגון החצר-הטיפול עליהם



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים -2-החצר האחורית בבית הספר-גמל מים ללא הגנה מתאימה. סכנת טיפוס ופציעה- - -
 20: 47 3.1-18/3/2023 -תשתיות-. או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם
